

Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : **Opf**

Type de visite : **Visite initiale**

IG de la visite : **U1**

Localisation : **205+806**

Voie : **A8**

Identifiant : **EcranPareBlocs_A8_205782_1**

Gestionnaire : **COTE D'AZUR**


Commune 1 : **LA TRINITE**

District : **COTE D'AZUR**

Date de la visite préc. :

Structure : **Ecran pare blocs**

Matériau :

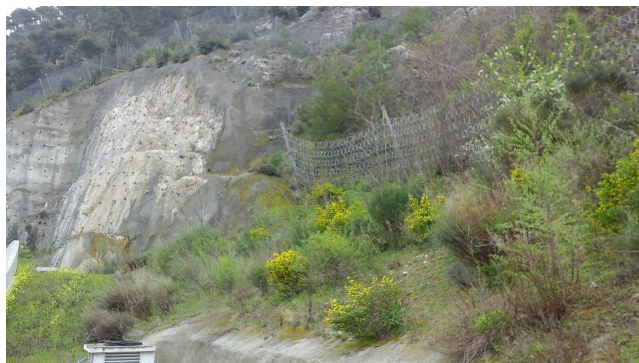

Conditions de la visite

Intervenant / Equipe : **Patrick CRISCIONE**

Autres participants :

Moyens mis en oeuvre :

Conditions atmosphériques : **Couvert**

Température (°C) :

Der. précipitations :

Date de la visite : **11/04/2019**

Constatations

Structure : **Ecran pare blocs**

Elévation (m) :

Année de construction : **1966**

Longueur (m) : **50.0**

Largeur (m) :

Hauteur (m) : **5.0**

Type de poteaux : **Métallique: HEA**

Type de filet : **Tressé à anneaux ou ASM: 6 contacts**

Ancrage type : **Ancrage Amont:d=25mm,latéraux: d=25mm et aval:d=25mm**

Présence Dissipateurs d'énergie : **Oui**

Travées : **5**

Classe : **7**

Norme : **NFP95-308**

Poseur : **SIMECO**

Désordre

Note

Localisation

Commentaire

1 - La végétation

Note: U2 ■

Végétation	B ■	Ecran végétalien à 29 Nombreux dissipateurs sous végétation
------------	---	---

1.1 - Présence de gros arbres

Note: NON ☒

Présence de gros arbres

NON ☒



F -- 12/04/2019 14:52:35

2 - Les poteaux

Note: RAS ☒

P4 (,)

RAS ☒

Nom : P4
Hauteur (m) : 5.0



E -- 12/04/2019 15:57:46

P5 (,)	RAS ■	Nom : P5 Hauteur (m) : 5.0 Evacuer cordage
---------	--	--



D -- 12/04/2019 14:21:27

3 - Les filets

Note: U1 ■

F1 (,)	U2 ■	Nom : F1 Présence Doublage grillage : true Présence Bavette : true Filet détendu remise en tension
---------	--	---



G -- 12/04/2019 14:37:57

F2 (,)	U2 ■	Nom : F2 Présence Doublage grillage : true Présence Bavette : true Entre p2 et p3 détendu
---------	--	--

F3 (,)	U1 ■	Nom : F3 Présence Doublage grillage : true Présence Bavette : true Remise en tension câble amont Arbre à couper
---------	---------------------------------------	---



F -- 12/04/2019 14:52:35

F4 (,)	RAS ■	Nom : F4 Présence Doublage grillage : true Présence Bavette : true
F5 (,)	RAS ■	Nom : F5 Présence Doublage grillage : true Présence Bavette : true

4 - Les dissipateurs d'énergie

Note: U2 ■

d1 (,)	RAS ■	Nom : d1 Type : Plaque (EI-HC, GTS, Siméco) Latéral sur p1
---------	--	--



I -- 12/04/2019 14:44:31

d2 (,)	U2 	Nom : d2 Type : Plaque (EI-HC, GTS, Siméco) Amont sur p1 Végétation à supprimer
---------	--	--



H -- 12/04/2019 14:46:12

d3 (,)	RAS 	Nom : d3 Type : Plaque (EI-HC, GTS, Siméco) Supprimer végétation
---------	---	--



J -- 12/04/2019 14:46:26

d4 (,)	RAS ■	Nom : d4 Type : Plaque (EI-HC, GTS, Siméco) 1 serre câble corrodé
----------	--	---



C -- 12/04/2019 14:48:02

d5 (,)	U2 ■	Nom : d5 Type : Plaque (EI-HC, GTS, Siméco) Amont sur p4 nettoyage terre
----------	--	--



B -- 12/04/2019 14:49:19

d6 (,)

U2 

Nom : d6
Type : Plaque (EI-HC, GTS, Siméco)
Légèrement enseveli à nettoyer



A -- 12/04/2019 14:50:22

Conclusions

Synthèse


Partie d'ouvrage	Note	Commentaire
La végétation	U2	
Les ancrages		
Les haubans		
Les poteaux	RAS	
Les filets	U1	
Les dissipateurs d'énergie	U2	

Commentaires

Conclusions

Interventions demandées

Carte

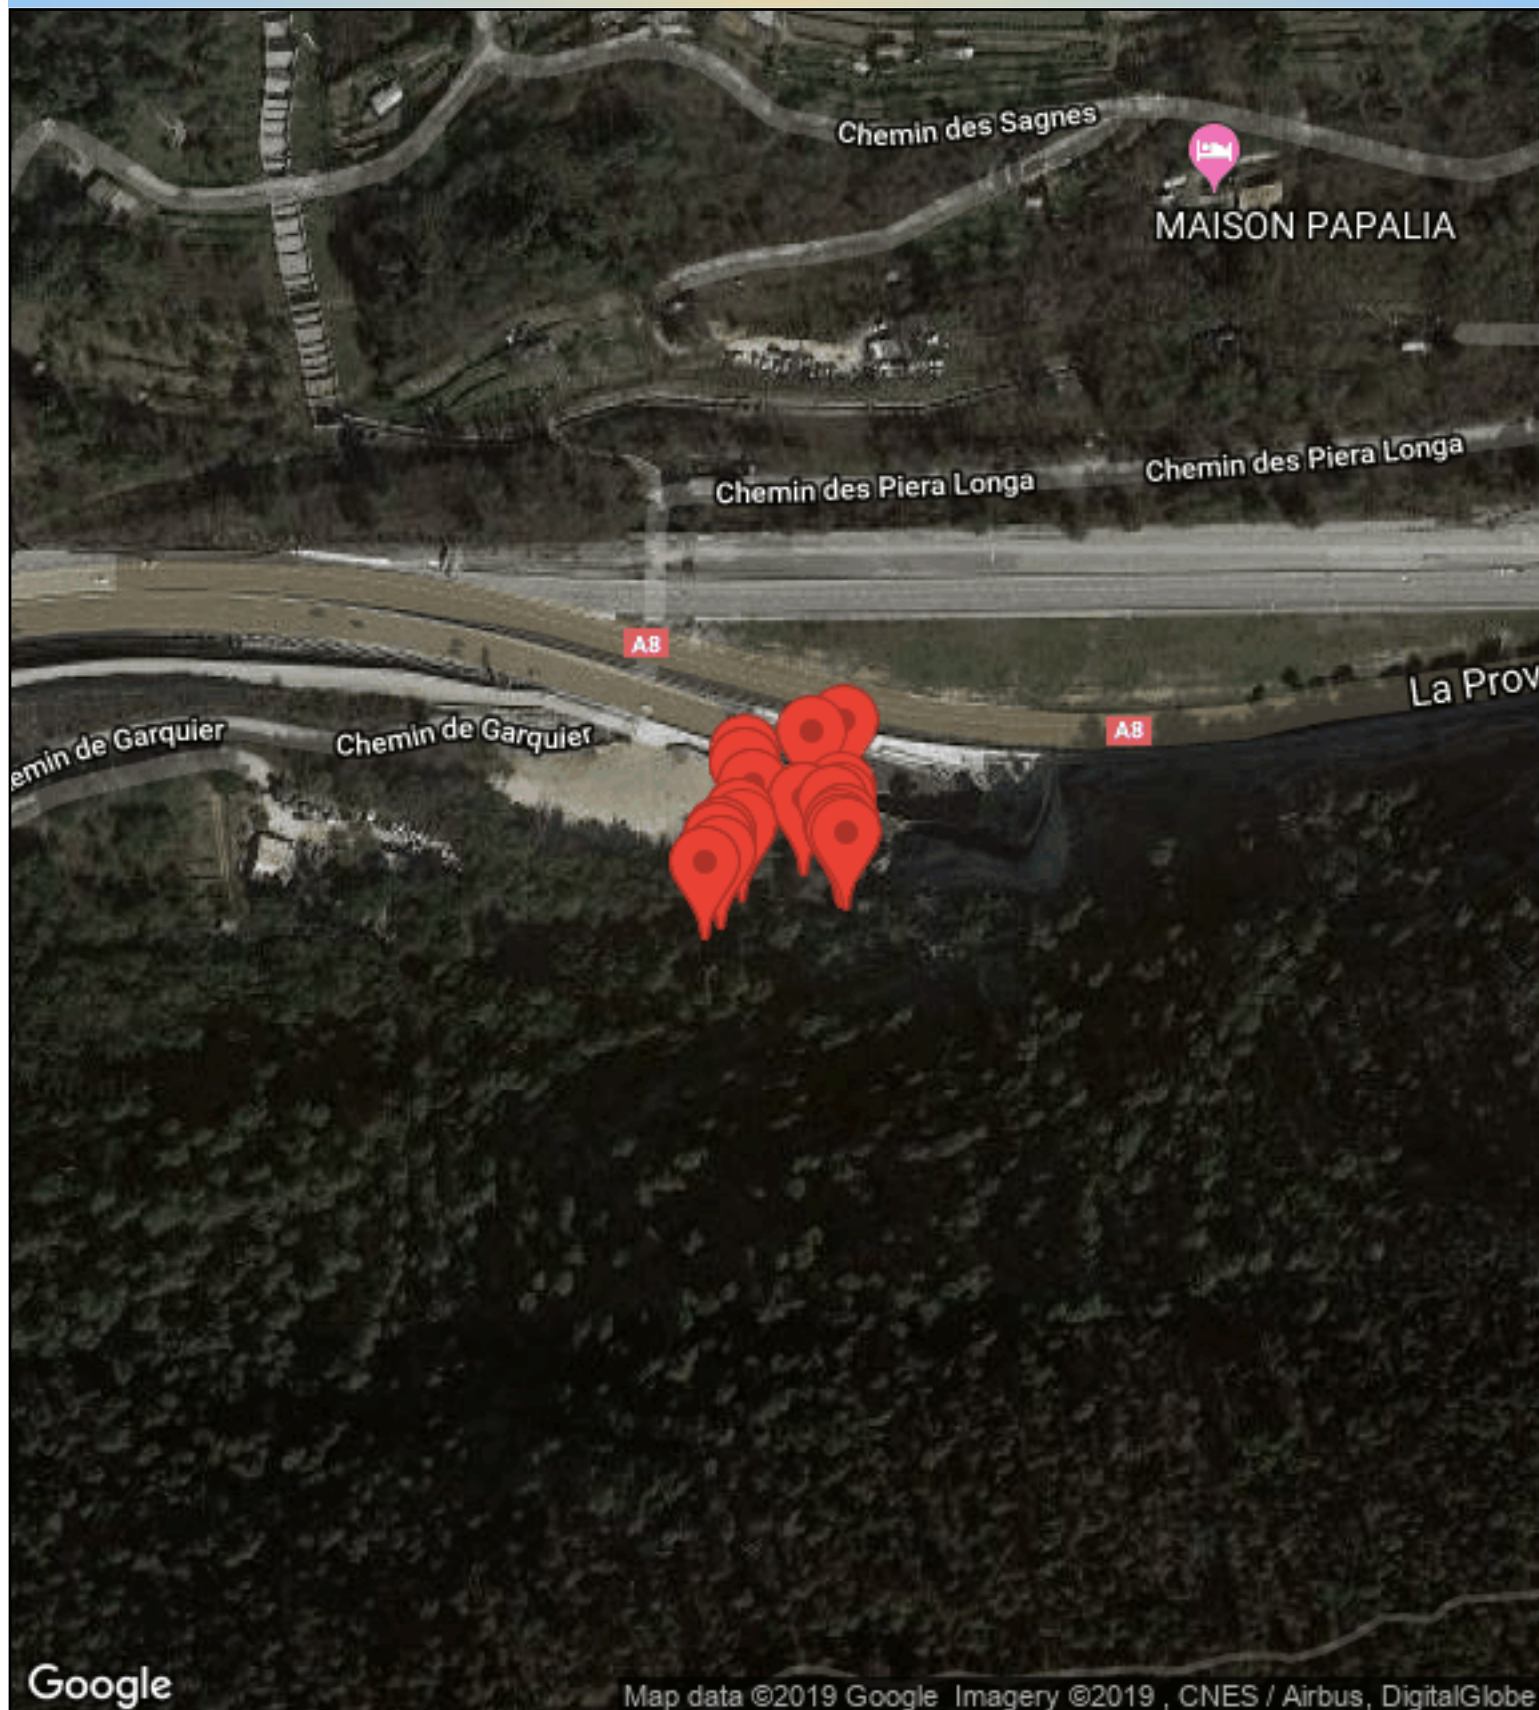

Dressé le à

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire

Table des matières

A/ Présentation générale.....	1
B/ Conditions de la visite.....	1
C/ Constatations.....	1
D/ Synthèse.....	8
E/ Conclusions et propositions d'action.....	8
