

27-29 novembre 2024




Analyse des ouvrages – Les groupes

Forum OASIS-OKAPI – Session 8




OASIS-OKAPI

Vendredi 29 novembre 2024



But poursuivi

- Développer l'entretien préventif sur les éléments sensibles
 - Dans le domaine des ponts, les fondations



Eléments sensibles les fondations

- Les fondations doivent être dimensionnées structurellement pour qu'elles résistent aux descentes de charge apportées par les appuis du pont et aux efforts engendrés par les déplacements éventuels des terrains.
- Elles doivent être étroitement surveillées : affouillement, ...

Eléments sensibles les fondations



24: Tassement de la pile médiane d'un pont due à l'affouillement local ...

Ponts – Notation(Fondations) >2

■ Tableau notation des ponts

	Notation (Fondations)	IGG	Sécurité	IG	Notation (Abords)	Notation (Superstructure)	Notation (Structure d'origine)	Notation (Elargissements)	Identifiant	Nom
<input type="checkbox"/>	4	13.8		4	1	2	4	0	D095 01	Pont de Badineau
<input type="checkbox"/>	3	18.13	S	5S	1	2	5S		C-177-202-3	
<input type="checkbox"/>	3	14.57	S	4S	2	2S	4		C-127-11-2	Rue des Prés Rabots
<input type="checkbox"/>	3	14.13		4	1	2	4		D030 13	
<input type="checkbox"/>	3	10.57	S	3S	2	2S	3		D003 02a	D003 02a
<input type="checkbox"/>	3	10.48		3	2	3	3		D918 07a	
<input type="checkbox"/>	3	9.93		3	2	2	3	0	D012 04	pont de la Grille
<input type="checkbox"/>	3	9.93		3	2	2	3	0	D940 12	Pont sur le Cher
<input type="checkbox"/>	3	9.73		3	2	2	2	0	D751 03	
<input type="checkbox"/>	3	10.13		3	2	1	3		D039 01	D039 01
<input type="checkbox"/>	3	9.39		3	2	1	2	0	D097 03	
<input type="checkbox"/>	3	10.13		3	1	3	3	3	D023 04	
<input type="checkbox"/>	3	9.8		3	1	2	3	1	D976 14	
<input type="checkbox"/>	3	9.7		3	1	2	3	0.5	D016 03	
<input type="checkbox"/>	3	9.6		3	1	2	3	0	D003 09	
<input type="checkbox"/>	3	9.6		3	1	2	3	0	D019 05	
<input type="checkbox"/>	3	9.6		3	1	2	3	0	D021 01	
<input type="checkbox"/>	3	9.6		3	1	2	3	0	D024 03	Pont du Coudray
<input type="checkbox"/>	3	9.6		3	1	2	3	0	D944 14	
<input type="checkbox"/>	3	10.13		3	1	2	3		D006 02	
<input type="checkbox"/>	3	10.13		3	1	2	3		D106 02	
<input type="checkbox"/>	3	10.13		3	1	2	3		D220 00	
<input type="checkbox"/>	3	9.6		3	1	2	2		D036 03	
<input type="checkbox"/>	3	9.6		3	1	2	2	1	D088 03	Pont de Lunery
<input type="checkbox"/>	3	9.39		3	1	2	2	0	D012 30	Pont des Mahauts
<input type="checkbox"/>	3	9.86		3	1	2	2		D997 08	
<input type="checkbox"/>	3	9.6		3	1	2	1		D190 02	
<input type="checkbox"/>	3	9.26		3	1	1	3	0	D087 02	
<input type="checkbox"/>	3	9.26		3	1	1	3	0	D187 02	Pont de Beaucaire
<input type="checkbox"/>	3	9.68		3	1	1	3		D104 02	
<input type="checkbox"/>	3	9.06		3	1	1	2		D168 03	
<input type="checkbox"/>	3	8.86		3	1	1	1	0	D118 02	
<input type="checkbox"/>	3	9.15		3	1	1	1		D158 01	D158 01
<input type="checkbox"/>	2	18.75	S	5S	2	3	5S		C-011-00	Pont des Rats
<input type="checkbox"/>	2	10.22	S	3S	2	3S	3		D136 00	


Analyse des visites - Groupe

■ Analyse détaillée

Année	IG Visite	Type de visite	Infrastructure	Action curative	Eléments	Statut
2024	SS	Visite initiale	C-177-202-3	23 Les culées Structure d'origine 35 Les tabliers Structure d'origine 53 Les murs en aile ou en retour Structure d'origine 3 Fondations Au vu de la culée 2 les fondations doivent être fracturées Eléments	2 Culée 0 (.) Une grosse fissure en amont et quelques micro-fissures calcifiées 5 Culée 1 (.) Culée complètement fracturée 55 Tablier 1 (Dalle pleine.) Éclat de béton avec fer apparent N'appuie plus sur la culée 2 MUR G1 (.) / Culée 0 BEG 2 Mur D1 (.) / Culée 0 D003 02a / null (.) 2 D003 02a / null (.) 1 Accotement Droit (.) 1 Accotement Gauche (.) 25 Dispositif De Retenue Droit (Glissière type GS2.) Pas de dispositif de retenue dénivelé de 4 à 5 mètres 1 Dispositif De Retenue Gauche (Glissière type GS2.) BEG 1 Demi tympan droit (.) / Culée 0 2 Demi tympan gauche (.) / Culée 0	Validée
2024	3S	Visite annuelle	D003 02a / D003 02a	Superstructure 3 Les voutes Structure d'origine 3 Fondations Fissure sur le radier. Affouillement à l'extrémité du radier côté aval. Eléments 25 Dispositif De Retenue Droit (Glissière type GS2.) Pas de dispositif de retenue dénivelé de 4 à 5 mètres 3 Voute 1 (.)	1 Demi tympan droit (.) / Culée 0 2 Chaussée (.) 1 Accotement Droit (.) 1 Accotement Gauche (.) 1 glissièreSecurite (.) / Accotement Droit BEG 1 glissièreSecurite (.) / Accotement Gauche BEG 3 Buse 1 (.)	Validée
2024	3	Visite annuelle	D003 09	Parties 3 Structure d'origine 3 Fondations Base de la buse oxydée Groupes 3 Les buses Structure d'origine 3 Fondations Base de la buse oxydée	1 D006 02 / null (.) 1 Accotement Droit (.) 1 Accotement Gauche (.) 1 Dispositif De Retenue Droit (G-C.type 58.) BEG 2 Dispositif De Retenue Gauche (G-C.type 58.) Un élément désolidarisé du à la fracture du mur 1 Buse 0 (éléments béton préfa., Béton armé) 3 Mur G2 (Béton coffré.)	Validée
2024	3	Visite annuelle	D006 02	Affouillement au niveau de la buse des eaux pluviales Groupes 3 Les murs en aile ou en retour Structure d'origine 3 Fondations Affouillement au niveau de la buse des eaux pluviales Eléments 3 Mur G2 (Béton coffré.) Fracture importante certainement dû à un défaut d'étanchéité d'évac	1 Dispositif De Retenue Droit (G-C.M.E.)	Validée
2024	3	Visite annuelle	D012 04 / pont de la Grille	Parties 3 Structure d'origine 3 Fondations	2 Trottoir Droit (.) 2 Trottoir Gauche (.) 1 Dispositif De Retenue Droit (G-C.M.E.)	Validée

Calcul des prestations

- Suppose la validation des visites

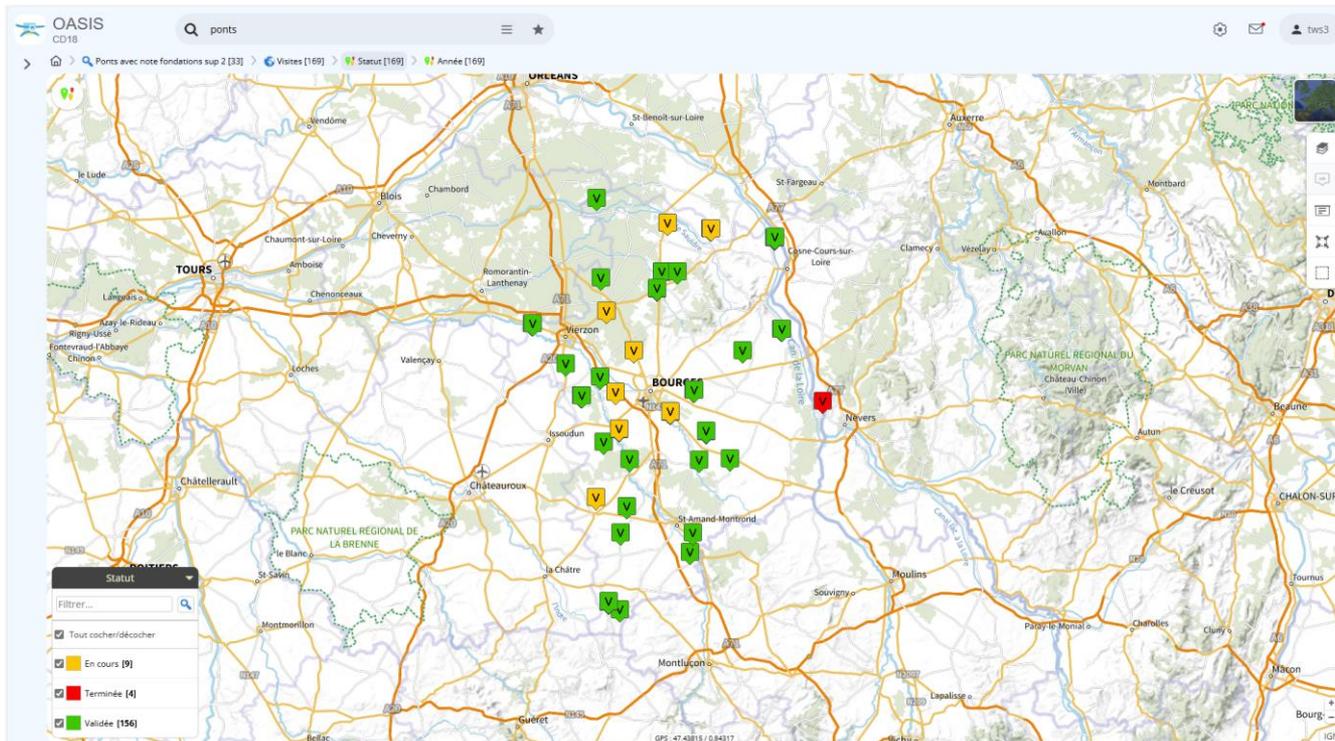

Analyse des prestations

OASIS CD18

points

Programme Infrastructure 2

Rechercher dans le tableau...

Date	IP	Infrastructure	Libelle	Année	Commentaire
05/11/2024	13.82	D190 02	Resoudre Fondations	2024	Affouillement aval
27/09/2024	25.72	D187 02 / Pont de Beaucaire	Resoudre Fondations	2024	Radier: TN et pierres. Embâcles. Affouillement important devant le bec de pile côté Am environ
27/09/2024	25.72	D187 02 / Pont de Beaucaire	Resoudre Les autres équipements	2024	Balises J13.
27/09/2024	25.72	D187 02 / Pont de Beaucaire	Resoudre Les piles	2024	Surveiller la fracture massif de fondation de la pile.
19/09/2024		C-177-202-3	Resoudre Fondations	2024	Au vu de la culée 2 les fondations doivent être fracturé
19/09/2024		C-177-202-3	Resoudre Les culées	2024	
19/09/2024		C-177-202-3	Resoudre Les murs en aile ou en retour	2024	
19/09/2024		C-177-202-3	Resoudre Les tabliers	2024	
12/09/2024	72.03	D976 14	Resoudre Fondations	2024	
12/09/2024	72.03	D976 14	Resoudre Les autres équipements	2024	Radier: TN 1, 2 et 3. profondeur importante sous chaque travée.
12/09/2024	72.03	D976 14	Resoudre Les culées	2024	E32 (Airain):
12/09/2024	72.03	D976 14	Resoudre Les piles	2024	
26/08/2024		D006 02	Resoudre Fondations	2024	Affouillement au niveau de la buse des eaux pluviales
26/08/2024		D006 02	Resoudre Les murs en aile ou en retour	2024	
22/08/2024	88.74	D940 12 / Pont sur le Cher	Resoudre Fondations	2024	Fracture horizontale au niveau de la pile 1 sur le redan Affouillement sous le redan pile 1 Affou
22/08/2024	88.74	D940 12 / Pont sur le Cher	Resoudre Les piles	2024	
22/08/2024	88.74	D940 12 / Pont sur le Cher	Resoudre Les voutes	2024	
20/08/2024		D003 02a / D003 02a	Resoudre Fondations	2024	Fissure sur le radier. Affouillement à l'extrémité du radier côté aval.
20/08/2024		D003 02a / D003 02a	Resoudre Les dispositifs de retenue	2024	
20/08/2024		D003 02a / D003 02a	Resoudre Les voutes	2024	
06/08/2024	18.43	D024 03 / Pont du Coudray	Resoudre Fondations	2024	Départ de matériaux et disjointement
06/08/2024	18.43	D024 03 / Pont du Coudray	Resoudre Les autres équipements	2024	J13 BEG
06/08/2024	18.43	D024 03 / Pont du Coudray	Resoudre Les culées	2024	
06/08/2024	18.43	D024 03 / Pont du Coudray	Resoudre Les murs en aile ou en retour	2024	
18/07/2024	34.51	D012 04 / pont de la Grille	Resoudre Fondations	2024	Non visibles Dégradation importante du radier en aval rive droite
18/07/2024	34.51	D012 04 / pont de la Grille	Resoudre Les autres équipements	2024	J13
18/07/2024	34.51	D012 04 / pont de la Grille	Resoudre Les culées	2024	
18/07/2024	34.51	D012 04 / pont de la Grille	Resoudre Les voutes	2024	
26/06/2024		D997 08	Resoudre Fondations	2024	Affaissement sur environ 1 mètre et 1 mètre de profondeur à 2 mètres de la sortie côté aval. A
05/06/2024	27.65	D036 03	Resoudre Fondations	2024	
05/06/2024	27.65	D036 03	Resoudre Les autres équipements	2024	J13 en bon état
03/05/2024	41.47	D003 09	Resoudre Fondations	2024	Base de la buse oxydée
03/05/2024	41.47	D003 09	Resoudre Les buses	2024	
20/12/2023	33.14	D751 03	Resoudre Fondations	2023	Dégradation du radier au centre de l'OA Mur entre OA CD18 et OA VNF en très mauvais état M

Pont D023 04

OASIS CD18

Rechercher...

Infrastructure

D023 04

11 photos
3 plans
1 carte
0 document
3 schémas

Général

Ouverture (m) 85.5
Longueur(m) 110.0
Matériau Maçonnerie pierres
Structure Voûte (Pont)
Nom

Ouvrage Voûte | Maçonnerie pierres

Visites (11)

3 2023 - Visite annuelle
2 2022 - Inspection détaillée périodique
3 2021 - Visite annuelle

Actions (5)

Pré-programmée 2023 - Post Visite annuelle 22/11/2023
Pré-programmée 2021 - Post Visite annuelle 24/09/2021
Pré-programmée 2019 - Post Visite par plongeur 20/09/2019

Etat

1 Abords 3 Superstructure
3 Structure d'origine
3 Fondations 3 Elargissements

Exploitation

IF 3

IG 3 IGG 10.1 IP 40.8

Commentaires

Travaux 2020 et 2021 : enlèvement d'embâcles

Infrastructures associées (0)

Action

D023 04

0 photo 0 plan 0 carte 0 document

Modifier Pré-programmée

Libellé Resoudre Fondations
Type GÉNÉRIQUE
Chapitre
Date prévue 22/11/2023
Durée (mois) 24
Surface tablier 869 m2

Commentaire

Affoulement important P2

Programme Infrastructure 2

1-71 sur 71

Date	IP	Infrastructure	Libelle	Année	Commentaire
05/11/2024	13.82	D190 02	Resoudre Fondations	2024	Affoulement aval
27/09/2024	25.72	D187 02 / Pont de Beaucaire	Resoudre Fondations	2024	Radier: TN et pierres. Embâcles. Affoulement important dev
19/09/2024		C-177-202-3	Resoudre Fondations	2024	Au vu de la culée 2 les fondations doivent être fracturé
12/09/2024	72.03	D976 14	Resoudre Fondations	2024	Radier: TN 1, 2 et 3, profondeur importante sous chaque trav
26/08/2024		D006 02	Resoudre Fondations	2024	Affoulement au niveau de la buse des eaux pluviales
22/08/2024	88.74	D940 12 / Pont sur le Cher	Resoudre Fondations	2024	Fracture horizontale au niveau de la pile 1 sur le redan Affou
20/08/2024		D003 02a / D003 02a	Resoudre Fondations	2024	Fissure sur le radier. Affoulement à l'extrémité du radier côt
06/08/2024	18.43	D024 03 / Pont du Coudray	Resoudre Fondations	2024	Départ de matériaux et dsjoints
18/07/2024	34.51	D012 04 / pont de la Grille	Resoudre Fondations	2024	Non visibles Dégradation importante du radier en aval rive dr
26/06/2024		D997 08	Resoudre Fondations	2024	Affaissement sur environ 1 mètre et 1 mètre de profondeur à
05/06/2024	27.65	D036 03	Resoudre Fondations	2024	
03/05/2024	41.47	D003 09	Resoudre Fondations	2024	Base de la buse oxydée
20/12/2023	33.14	D751 03	Resoudre Fondations	2023	Dégradation du radier au centre de l'OA Mur entre OA CD18 et
22/11/2023	41.05	D023 04	Resoudre Fondations	2023	Affoulement important P2
06/11/2023	46.08	D944 14	Resoudre Fondations	2023	Affoulement C0 droit à traiter à court terme
16/08/2023	47.61	D095 01 / Pont de Badineau	Resoudre Fondations	2023	Dégradation du pied de la pile en amont
12/07/2023		D918 07a	Resoudre Fondations	2023	Radier mauvais état
30/06/2023		C-127-11-2 / Rue des Prés Rabots	Resoudre Fondations	2023	Pierres manquantes en aval de la culée 0.
29/06/2023	12.31	D168 03	Resoudre Fondations	2023	Disparition du radier sur 5m de long et 3m de large Affoulem
29/06/2023		D039 01 / D039 01	Resoudre Fondations	2023	Réparer les pierres pieds de culées
28/06/2023	13.83	D019 05	Resoudre Fondations	2023	Affoulement environ 60cm sous le redan en C0 aval
27/06/2023	11.77	D118 02	Resoudre Fondations	2023	Ancien radier se disloque
09/06/2023	9.22	D021 01	Resoudre Fondations	2023	Non visibles Affaissement à partir du cadre 2 jusqu'à 5
18/04/2023	8.82	D097 03	Resoudre Fondations	2023	Passage de l'eau sous le radier et ressort par la berge droite 1
16/03/2023		D220 00	Resoudre Fondations	2023	Affaissement en aval
01/03/2023		D158 01 / D158 01	Resoudre Fondations	2023	Radier: Buses béton non armé, affoulement important sous
31/01/2023	21.44	D087 02	Resoudre Fondations	2023	Radiers fracturés avec infiltrations d'eau en aval
08/12/2022	23.52	D016 03	Resoudre Fondations	2022	Radier arraché
07/11/2022		D158 01 / D158 01	Resoudre Fondations	2022	Affoulement en aval
03/11/2022	34.51	D012 04 / pont de la Grille	Resoudre Fondations	2022	Comblement d'affoulement
11/10/2022	27.65	D088 03 / Pont de Lunery	Resoudre Fondations	2022	Érosion C0
22/09/2022	11.72	D118 02	Resoudre Fondations	2022	Desolidarisation du radier
21/09/2022	34.51	D012 04 / pont de la Grille	Resoudre Fondations	2022	Effondrement d'une partie du radier en aval côté C1 sur 3m C
15/07/2022	28.81	D018 07	Resoudre Fondations	2022	Pierres manquantes en c3 et pile 2 IDP 2021 :- Rejointoieme
05/07/2022		D003 02a / D003 02a	Resoudre Fondations	2022	Trou en bout de radier en aval
04/07/2022		D006 02	Resoudre Fondations	2022	Infiltration et affoulement sous le mur G2
24/06/2022	72.03	D976 14	Resoudre Fondations	2022	
24/05/2022	41.47	D003 09	Resoudre Fondations	2022	Métal oxydé
11/03/2022	39.68	D012 30 / Pont des Mahauts	Resoudre Fondations	2022	Non visible (Canal de jonction). Redans : Altération des pie
02/02/2022		D106 02	Resoudre Fondations	2022	Radier mauvais état
19/01/2022		D104 02	Resoudre Fondations	2022	Radier aval à refaire avec passe à poisson
11/01/2022		D030 13	Resoudre Fondations	2022	Affaissement du radier en aval
21/10/2021	39.44	D751 03	Resoudre Fondations	2021	Dégradation du radier en aval Affoulement en Amont de l'OA

Pont de Badineau

OASIS CD18

Rechercher...

Infrastructure

Liste des photos

D095 01 / Pont de Badineau

0 photo 0 plan 0 carte 0 document

Modifier Pré-programmée

Libellé **Resoudre Fondations**

Type Resoudre

Chapitre GNERIQUE

Date prévue 16/08/2023

Durée (mois) 12

Surface tablier 133 m2

Commentaire

Dégradation du pied de la pile en amont

01d09501-em.jpg

01d09501-av.jpg

01d09501-ax.jpg

Rechercher dans le tableau...

Programme Infrastructure 2

1-71 sur 71

Date	IP	Infrastructure	Libelle	Année	Commentaire
05/11/2024	13.82	D190 02	Resoudre Fondations	2024	Affouillement aval
27/09/2024	25.72	D187 02 / Pont de Beaucaire	Resoudre Fondations	2024	Radier: TN et Ancres. Embâcles. Affouillement important devant
19/09/2024		C-177-202-3	Resoudre Fondations	2024	Au vu de la culée 2 les fondations doivent être fracturée
12/09/2024	72.03	D976 14	Resoudre Fondations	2024	Radier: TN 1, 2 et 3, profondeur importante sous chaque travée
26/08/2024		D006 02	Resoudre Fondations	2024	Affouillement au niveau de la buse des eaux pluviales
22/08/2024	88.74	D940 12 / Pont sur le Cher	Resoudre Fondations	2024	Fracture horizontale au niveau de la pile 1 sur le redan Affouille
20/08/2024		D003 02a / D003 02a	Resoudre Fondations	2024	Fissure sur le radier. Affouillement à l'extrémité du radier côté z
06/08/2024	18.43	D024 03 / Pont du Coudray	Resoudre Fondations	2024	Départ de matériaux et disjointement
18/07/2024	34.51	D012 04 / pont de la Grille	Resoudre Fondations	2024	Non visibles Dégradation importante du radier en aval rive droi
26/06/2024		D997 08	Resoudre Fondations	2024	Affaisssement sur environ 1 mètre et 1 mètre de profondeur à 2
05/06/2024	27.65	D036 03	Resoudre Fondations	2024	
03/05/2024	41.47	D003 09	Resoudre Fondations	2024	Base de la buse oxydée
20/12/2023	33.14	D751 03	Resoudre Fondations	2023	Dégradation du radier au centre de l'OA Mur entre OA CD18 et
22/11/2023	41.05	D023 04	Resoudre Fondations	2023	Affouillement important P2
06/11/2023	46.08	D944 14	Resoudre Fondations	2023	Affouillement C0 droit à traiter à court terme
16/08/2023	47.61	D095 01 / Pont de Badineau	Resoudre Fondations	2023	Dégradation du pied de la pile en amont
12/07/2023		D918 07a	Resoudre Fondations	2023	Radier mauvais état
30/06/2023		C-127-11-2 / Rue des Prés Rabots	Resoudre Fondations	2023	Pierres manquantes en aval de la culée 0.
29/06/2023	12.31	D168 03	Resoudre Fondations	2023	Disparition du radier sur 5m de long et 3m de large Affouilleme
29/06/2023		D039 01 / D039 01	Resoudre Fondations	2023	Réparer les pierres pieds de culées
28/06/2023	13.82	D019 05	Resoudre Fondations	2023	Affouillement environ 60cm sous le redan en CD aval
27/06/2023	11.77	D118 02	Resoudre Fondations	2023	Ancien radier se disloque
09/06/2023	9.22	D021 01	Resoudre Fondations	2023	Non visibles Affaisssement à partir du cadre 2 Jusqu'à 5
18/04/2023	8.82	D097 03	Resoudre Fondations	2023	Passage de l'eau sous le radier et ressort par la berge droite Trc
16/03/2023		D220 00	Resoudre Fondations	2023	Affaisssement en aval
01/03/2023		D158 01 / D158 01	Resoudre Fondations	2023	Radier: Buses béton non armé, affouillement important sous le
31/01/2023	21.44	D087 02	Resoudre Fondations	2023	Radiers fracturés avec infiltrations d'eau en aval
08/12/2022	23.52	D016 03	Resoudre Fondations	2022	Radier arraché
07/11/2022		D158 01 / D158 01	Resoudre Fondations	2022	Affouillement en aval
03/11/2022	34.51	D012 04 / pont de la Grille	Resoudre Fondations	2022	Comblement d'affouillement
11/10/2022	27.65	D088 03 / Pont de Lunery	Resoudre Fondations	2022	Érosion C0
22/09/2022	11.77	D118 02	Resoudre Fondations	2022	Desolidarisation du radier
21/09/2022	34.51	D012 04 / pont de la Grille	Resoudre Fondations	2022	Effondrement d'une partie du radier en aval côté C1 sur 3m Dê
15/07/2022	28.81	D018 07	Resoudre Fondations	2022	Pierres manquantes en c3 et pile 2 IDP 2021 : - Rejoitement i
05/07/2022		D003 02a / D003 02a	Resoudre Fondations	2022	Trou en bout de radier en aval
04/07/2022		D006 02	Resoudre Fondations	2022	infiltration et affouillement sous le mur G2
24/06/2022	72.03	D976 14	Resoudre Fondations	2022	
24/05/2022	41.47	D003 09	Resoudre Fondations	2022	Métal oxydé
11/03/2022	39.68	D012 30 / Pont des Mahauts	Resoudre Fondations	2022	Non visitable (Canal de jonction). Redans : Altération des pierr
02/02/2022		D106 02	Resoudre Fondations	2022	Radier mauvais état
19/01/2022		D104 02	Resoudre Fondations	2022	Radier aval à refaire avec passe à poisson
11/01/2022		D030 13	Resoudre Fondations	2022	Affaisssement du radier en aval

Pont du Coudray

OASIS CD18

Rechercher...

Infrastructure

Liste des photos

D024 03 / Pont du Coudray

0 photo 0 plan 0 carte 0 document

Modifier **Pre-programmée**

Libellé **Resoudre Fondations**

Type Resoudre

Chapitre GENERIQUE

Date prévue 06/08/2024

Durée (mois) 24

Surface tablier 58 m2

Commentaire

Départ de matériaux et disjointement

04d02402a.jpg
13/05/2009
aval

04d02402a.jpg
13/05/2009
amont

04d02402-ox.jpg

Rechercher dans le tableau...

Programme Infrastructure 2

1-71 sur 71

Date	IP	Infrastructure	Libelle	Année	Commentaire
05/11/2024	13.82	D190 02	Resoudre Fondations	2024	Affouillement aval
27/09/2024	25.72	D187 02 / Pont de Beaucaire	Resoudre Fondations	2024	Radier: TN et pierres. Embâcles. Affouillement important devant
19/09/2024		C-177-202-3	Resoudre Fondations	2024	Au vu de la culée 2 les fondations doivent être fracturé
12/09/2024	72.03	D976 14	Resoudre Fondations	2024	Radier: TN 1, 2 et 3, profondeur importante sous chaque travée
26/08/2024		D006 02	Resoudre Fondations	2024	Affouillement au niveau de la buse des eaux pluviales
22/08/2024	88.74	D940 12 / Pont sur le Cher	Resoudre Fondations	2024	Fracture horizontale au niveau de la pile 1 sur le redan Affouille
20/08/2024		D003 02a / D003 02a	Resoudre Fondations	2024	Fissure sur le radier. Affouillement à l'extrémité du radier côté d
06/08/2024	18.43	D024 03 / Pont du Coudray	Resoudre Fondations	2024	Départ de matériaux et disjointement
18/07/2024	34.51	D012 04 / pont de la Grille	Resoudre Fondations	2024	Non visibles Dégradation importante du radier en aval rive droi
26/06/2024		D997 08	Resoudre Fondations	2024	Affaisssement sur environ 1 mètre et 1 mètre de profondeur à 2
05/06/2024	27.65	D036 03	Resoudre Fondations	2024	
03/05/2024	41.47	D003 09	Resoudre Fondations	2024	Base de la buse oxydée
20/12/2023	33.14	D751 03	Resoudre Fondations	2023	Dégradation du radier au centre de l'OA Mur entre OA CD18 et
22/11/2023	41.05	D023 04	Resoudre Fondations	2023	Affouillement important P2
06/11/2023	46.08	D944 14	Resoudre Fondations	2023	Affouillement C0 droit à traiter à court terme
16/08/2023	47.61	D095 01 / Pont de Badineau	Resoudre Fondations	2023	Dégradation du pied de la pile en amont
12/07/2023		D918 07a	Resoudre Fondations	2023	Radier mauvais état
30/06/2023		C-127-11-2 / Rue des Prés Rabots	Resoudre Fondations	2023	Pierres manquantes en aval de la culée 0.
29/06/2023	12.31	D168 03	Resoudre Fondations	2023	Disparition du radier sur 5m de long et 3m de large Affouilleme
29/06/2023		D039 01 / D039 01	Resoudre Fondations	2023	Réparer les pierres pieds de culées
28/06/2023	13.82	D019 05	Resoudre Fondations	2023	Affouillement environ 60cm sous le redan en C0 aval
27/06/2023	11.77	D118 02	Resoudre Fondations	2023	Ancien radier se disloque
09/06/2023	9.22	D021 01	Resoudre Fondations	2023	Non visibles Affaisssement à partir du cadre 2 jusqu'à 5
18/04/2023	8.82	D097 03	Resoudre Fondations	2023	Passage de l'eau sous le radier et ressort par la berge droite Trc
16/03/2023		D220 00	Resoudre Fondations	2023	Affaisssement en aval
01/03/2023		D158 01 / D158 01	Resoudre Fondations	2023	Radier: Buses béton non armé, affouillement important sous les
31/01/2023	21.44	D087 02	Resoudre Fondations	2023	Radiers fracturés avec infiltrations d'eau en aval
08/12/2022	23.52	D016 03	Resoudre Fondations	2022	Radier arraché
07/11/2022		D158 01 / D158 01	Resoudre Fondations	2022	Affouillement en aval
03/11/2022	34.51	D012 04 / pont de la Grille	Resoudre Fondations	2022	Comblement d'affouillement
11/10/2022	27.65	D088 03 / Pont de Lunery	Resoudre Fondations	2022	Érosion C0
22/09/2022	11.77	D118 02	Resoudre Fondations	2022	Desolidarisation du radier
21/09/2022	34.51	D012 04 / pont de la Grille	Resoudre Fondations	2022	Effondrement d'une partie du radier en aval côté C1 sur 3m Dé
15/07/2022	28.81	D018 07	Resoudre Fondations	2022	Pierres manquantes en c3 et pile 2 IDP 2021 : - Rejointement c
05/07/2022		D003 02a / D003 02a	Resoudre Fondations	2022	Trou en bout de radier en aval
04/07/2022		D006 02	Resoudre Fondations	2022	Infiltration et affouillement sous le mur G2
24/05/2022	72.03	D976 14	Resoudre Fondations	2022	
24/05/2022	41.47	D003 09	Resoudre Fondations	2022	
11/03/2022	39.68	D0130 3 / Pont des Mahauts	Resoudre Fondations	2022	Métal oxydé
02/02/2022		D106 02	Resoudre Fondations	2022	Non visible (Canal de jonction). Redans : Altération des pierr
19/01/2022		D104 02	Resoudre Fondations	2022	Radier mauvais état
11/01/2022		D030 13	Resoudre Fondations	2022	Radier aval à refaire avec passe à poisson
			Resoudre Fondations	2022	Affaisssement du radier en aval

Pont sur le Cher

OASIS
CD18

Rechercher...

Infrastructure

Liste des photos

D940 12 / Pont sur le Cher



02d94012-am.jpg



02d94012-av.jpg

Action

D940 12 / Pont sur le Cher

0 photo 0 plan 0 carte 0 document

Modifier Pré-programmée

Libellé **Resoudre Fondations**

Type Resoudre

Chapitre GENERIQUE

Date prévue 22/09/2024

Durée (mois) 24

Surface tablier 671 m2

Commentaire

Fracture horizontale au niveau de la pile 1 sur le redan
Affouillement sous le redan pile 1 Affouillement sous l'arrière bec avec pieux apparent et fracture du redan côté aval
Corrosion des palplanches

Programme Infrastructure 2

1-71 sur 71

Date	IP	Infrastructure	Libelle	Année	Commentaire
05/11/2024	13.82	D190 02	Resoudre Fondations	2024	Affouillement aval
27/09/2024	25.72	D187 02 / Pont de Beaucaire	Resoudre Fondations	2024	Radier: TN et pierres. Embâcles. Affouillement important devant
19/09/2024		C-177-202-3	Resoudre Fondations	2024	Au vu de la culée 2 les fondations doivent être fracturé
12/09/2024	72.03	D976 14	Resoudre Fondations	2024	Radier: TN 1, 2 et 3, profondeur importante sous chaque travée
26/08/2024		D006 02	Resoudre Fondations	2024	Affouillement au niveau de la buse des eaux pluviales
22/08/2024	88.74	D940 12 / Pont sur le Cher	Resoudre Fondations	2024	Fracture horizontale au niveau de la pile 1 sur le redan Affouille
20/08/2024		D003 02a / D003 02a	Resoudre Fondations	2024	Fissure sur le radier. Affouillement à l'extrémité du radier côté z
06/08/2024	18.43	D024 03 / Pont du Coudray	Resoudre Fondations	2024	Départ de matériaux et disjoints
18/07/2024	34.51	D012 04 / pont de la Grille	Resoudre Fondations	2024	Non visibles Dégradation importante du radier en aval rive droi
26/06/2024		D997 08	Resoudre Fondations	2024	Affaisssement sur environ 1 mètre et 1 mètre de profondeur à 2
05/06/2024	27.65	D036 03	Resoudre Fondations	2024	
03/05/2024	41.47	D003 09	Resoudre Fondations	2024	Base de la buse oxydée
20/12/2023	33.14	D751 03	Resoudre Fondations	2023	Dégradation du radier au centre de l'OA Mur entre OA CD18 et
22/11/2023	41.05	D023 04	Resoudre Fondations	2023	Affouillement important P2
06/11/2023	46.08	D944 14	Resoudre Fondations	2023	Affouillement C0 droit à traiter à court terme
16/08/2023	47.61	D095 01 / Pont de Badineau	Resoudre Fondations	2023	Dégradation du pied de la pile en amont
12/07/2023		D918 07a	Resoudre Fondations	2023	Radier mauvais état
30/06/2023		C-127-11-2 / Rue des Prés Rabots	Resoudre Fondations	2023	Pierres manquantes en aval de la culée 0.
29/06/2023	12.31	D168 03	Resoudre Fondations	2023	Disparition du radier sur 5m de long et 3m de large Affouilleme
29/06/2023		D039 01 / D039 01	Resoudre Fondations	2023	Réparer les pierres pieds de culées
28/06/2023	13.82	D019 05	Resoudre Fondations	2023	Affouillement environ 60cm sous le redan en C0 aval
27/06/2023	11.77	D118 02	Resoudre Fondations	2023	Ancien radier se disloque
09/06/2023	9.22	D021 01	Resoudre Fondations	2023	Non visibles Affaisssement à partir du cadre 2 Jusqu'à 5
18/04/2023	8.82	D097 03	Resoudre Fondations	2023	Passage de l'eau sous le radier et ressort par la berge droite Trc
16/03/2023		D220 00	Resoudre Fondations	2023	Affaisssement en aval
01/03/2023		D158 01 / D158 01	Resoudre Fondations	2023	Radier: Buses béton non armé. affouillement important sous les
31/01/2023	21.44	D087 02	Resoudre Fondations	2023	Radiers fracturés avec infiltrations d'eau en aval
08/12/2022	23.52	D016 03	Resoudre Fondations	2022	Radier arraché
07/11/2022		D158 01 / D158 01	Resoudre Fondations	2022	Affouillement en aval
03/11/2022	34.51	D012 04 / pont de la Grille	Resoudre Fondations	2022	Comblement d'affouillement
11/10/2022	27.65	D088 03 / Pont de Lunery	Resoudre Fondations	2022	Erosion C0
22/09/2022	11.77	D118 02	Resoudre Fondations	2022	Desolidarisation du radier
21/09/2022	34.51	D012 04 / pont de la Grille	Resoudre Fondations	2022	Effondrement d'une partie du radier en aval côté C1 sur 3m Dé
15/07/2022	28.81	D018 07	Resoudre Fondations	2022	Pierres manquantes en c3 et pile 2 IDP 2021 :- Rejointoiement t
05/07/2022		D003 02a / D003 02a	Resoudre Fondations	2022	Trou en bout de radier en aval
04/07/2022		D006 02	Resoudre Fondations	2022	Infiltration et affouillement sous le mur G2
24/06/2022	72.03	D976 14	Resoudre Fondations	2022	
24/05/2022	41.47	D003 09	Resoudre Fondations	2022	Métal oxydé
11/03/2022	39.68	D012 30 / Pont des Mahauts	Resoudre Fondations	2022	Non visitable (Canal de jonction). Redans : Altération des pier
02/02/2022		D106 02	Resoudre Fondations	2022	Radier mauvais état
19/01/2022		D104 02	Resoudre Fondations	2022	Radier aval à refaire avec passe à poisson
11/01/2022		D030 13	Resoudre Fondations	2022	Affaisssement du radier en aval
